



ASİA KONTAYNER KURULUM KILAVUZU

KURULUM ÖNCESİ


BETON KİRİŞ ZEMİN VE ÖLÇÜLERİ

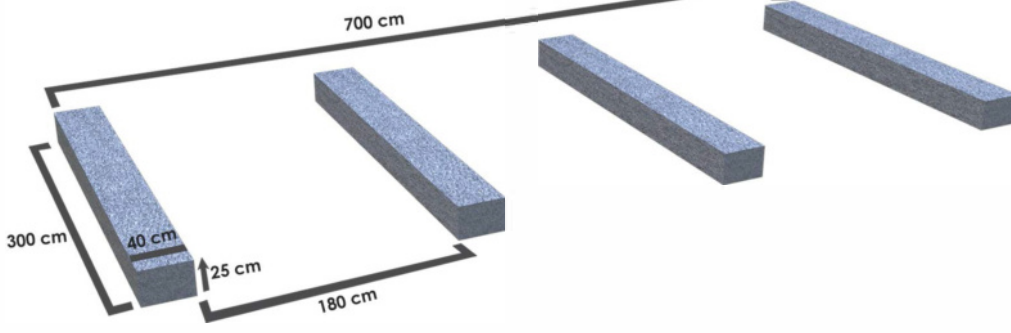


BETON BLOK ZEMİN VE ÖLÇÜLERİ

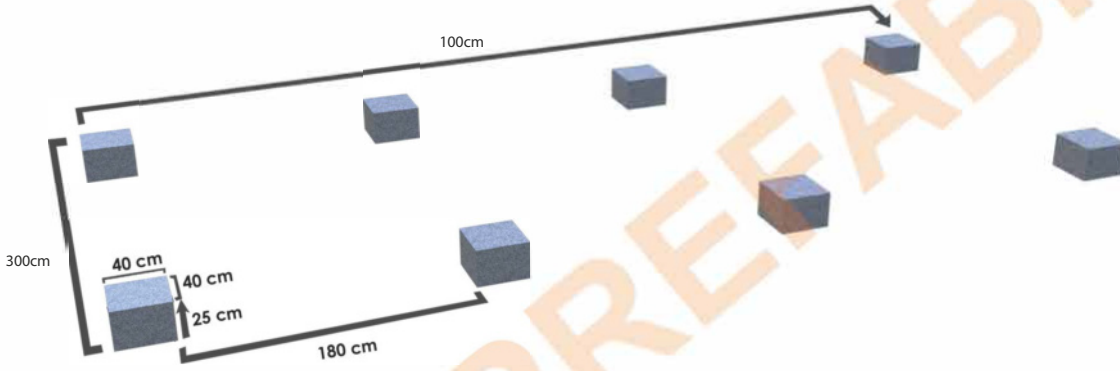

TERAZİ KONTROLÜ VE KULLANILACAK EKİPMANLAR



BETON KİRİŞ ZEMİN TERAZİ EKSENLERİ



BETON BLOK ZEMİN TERAZİ EKSENLERİ



Optik veya Lazer Nova



Su Terazisi



Şerit Metre




Hortum Terazisi

Yukarıda belirtilen ölçüler tekli konteyner içindir. Birleşimli veya çok katlı konteynerler için bu ölçümler kullanılamaz. Zemin ölçüleri ve terazisi uygun komple beton zemin üzerine de kurulum yapılabilir. Zemin ölçüleri ve terazisi uygun olmayan yerlere kurulum yapılmaz.

KONTEYNER KURULUM AŞAMALARI

1 - KONTEYNERİN VİNÇ İLE SEVKİ

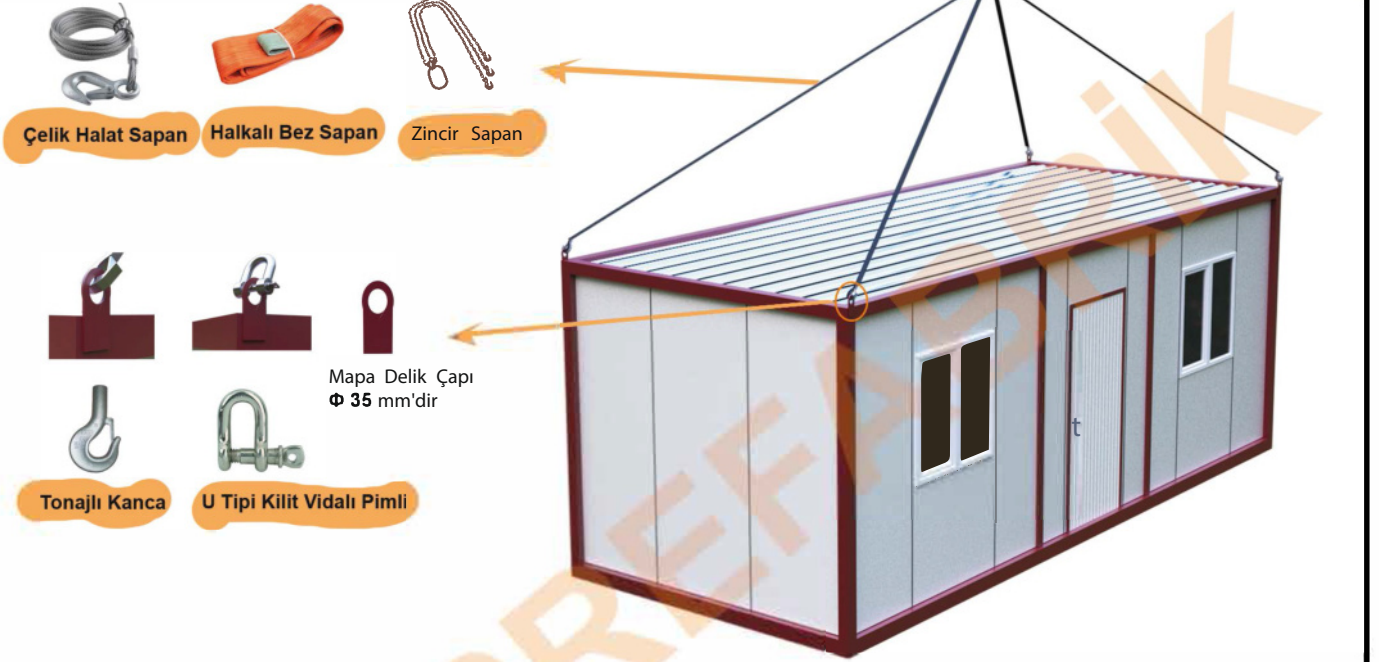


DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Yukarıda belirtilen tipler dışında ekipman, mapa veya kanca kullanmayınız. Kanca daima içten takılmalı, emniyet mandalı dışa bakmalıdır. Emniyet mandalı olmayan kanca kullanılmamalıdır. Belgesiz, uzman olmayan kişilerin konteyner sevk, taşıma, kaldırma yapması uygun değildir. Belge ve ehliyet sorunuz.

2 - KONTEYNERİN ZEMİNE YERLEŞİMİ

Kuşbakışı Görünüş



Perspektif Görünüş



Konteyner zemin üzerine ortalanacak şekilde konumlandırılmalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- * Konteyner üzerine çıkılmamalıdır. Eğer gerekiyorsa iskele kurulmalı, çatı saçları üzerine basılmamalıdır.
- * Konteyner üzerine depo, klima dış ünitesi, anten vs. malzeme konulmamalıdır.
- * Konteyner yükleme ve indirme işlemlerine kesinlikle dikkat edilmelidir. (Bkz Sayfa 2)
- * Konteyner içerisinde malzeme varken yükleme veya konteyner yer değiştirme yapılmamalıdır.
- * Konteyner iç zemini yük taşıma kapasitesi **200 kg/m²** dir. Konteynerde iç mekan yerleşimi yapılırken bunlara dikkat edilmelidir.
- * Konteyner yerleştirilmek istenen zemin muhakkak ASİA PREFABRİK tarafından belirtilen kriterlerde olmalıdır. (Bkz. Sayfa 1)
- * Konteyner elektrik, telefon, veri hatlarının bağlantıları muhakkak uzman kişilerce yapılmalı veya yaptırılmalıdır.
- * Konteyner üzerinde bulunan alüminyum "**ASİA PREFABRİK KONTEYNER**" etiketi garantinin veya servis hizmetlerinin geçerliliği için sökülmemelidir.

✗ YANLIŞ



✓ DOGRU

✓ Çanak anten
✓ Çatı hizasını geçmemelidir

✓ Çatı sacına basılmamalı
✓ İskele kurulmalıdır

✓ Klima Ünitesi
✓ çatıya konulmamalı
✓ veya panele takılmamalıdır

✓ Depolar, konteyner dışında olmalıdır

